ANEXA 10.4-1

Programul actiunilor pentru implementarea PITL

ID	Activitatea	Responsabili	Luni	Start	End
1.0	**Implementarea PITL**	AT, CJ, MM	49	Dec-08	Dec-12
1.1	**FAZA PREGATITOARE**	AT, CJ, MM	7	Dec-08	Jul-09
1.1.1	PITL	Elaborare AT, aprobare CJ, MM	5	Dec-08	May-09
1.1.2	Obtinerea amplasamentelor	CJ	4	Mar-09	Jun-09
1.1.3	Elaborare SF	Elaborare AT, aprobare CJ, MM	2	May-09	Jul-09
1.1.4	Elaborare CBA	Elaborare AT, aprobare CJ, MM	2	Jun-09	Jul-09
1.1.5	Analiza Institutionala	Elaborare AT, aprobare CJ, MM	4	Feb-09	Jun-09
1.1.6	Realizare cadru institutional crearea ADI, UIP	CJ	4	Feb-09	Jun-09
1.1.7	Evaluarea impactului asupra mediului	Elaborare AT, aprobare CJ, ARPM Regiunea 2 SE	2	May-09	Jul-09
1.1.8	Elaborarea aplicatiei	Elaborare AT, aprobare CJ, MM	11	May-09	Apr-10
1.2	**APROBAREA APLICATIEI**	**Comisia de evaluare UE**	1	Apr-10	May-10
1.2.1	Pregatirea documentatiei de atribuire- contracte servicii	Elaborare AT, aprobare CJ, MM	1	Apr-10	May-10
1.2.2	Licitatie si contractare servicii Audit*	Organizator UIP aprobare ADI, MM	2	May-10	Jul-10
1.2.3	Derulare Audit	UIP, Auditor-Aprob. Monit.: MM, ADI	29	Jul-10	Dec-12
1.2.4	Licitatie si contractare servicii ATM si supervizare	Organizator UIP Aprobare MM, ADI	2	Jun-10	Aug-10
1.2.5	Derulare ATM si supervizare	UIP, Monitorizare: MM, ADI	29	Aug-10	Dec-12
1.2.6	Pregatirea documentatiei de atribuire- contracte achizitii	Elaborare AT, aprobare CJ, MM	1	Apr-10	May-10
1.2.7	Licitatie si contractare achizitii containere si pubele	Organizator UIP aprobare ADI, MM	2	Jul-10	Sep-10
1.2.8	Derularea achizitiilor de containere si pubele	ECMS	3	Sep-10	Dec-10
1.2.9	Pregatirea documentatiei de atribuire- contracte lucrari	Elaborare AT, aprobare CJ, MM	2	Apr-10	Jun-10
1.2.10	Licitatie si contractare lucrari	Organizator UIP aprobare ADI, MM	2	Jun-10	Aug-10
1.2.11	Derulare lucrari	ECMS	18	Aug-10	Feb-12
1.2.12	Licitarea si contractarea serviciilor de operare	Organizator UIP aprobare ADI, MM	2	May-10	Jul-10
1.2.13	Derularea serviciilor de operare	ECMS	29	Sep-10	Jan-13
1.2.14	Instruirea beneficiarilor finali	Elaborare AT, UIP aprobare CJ, MM	3	May-10	Aug-10
1.2.15	Campanie de constientizare a publicului	CJ, UIP, ADI	41	Aug-09	Dec-12

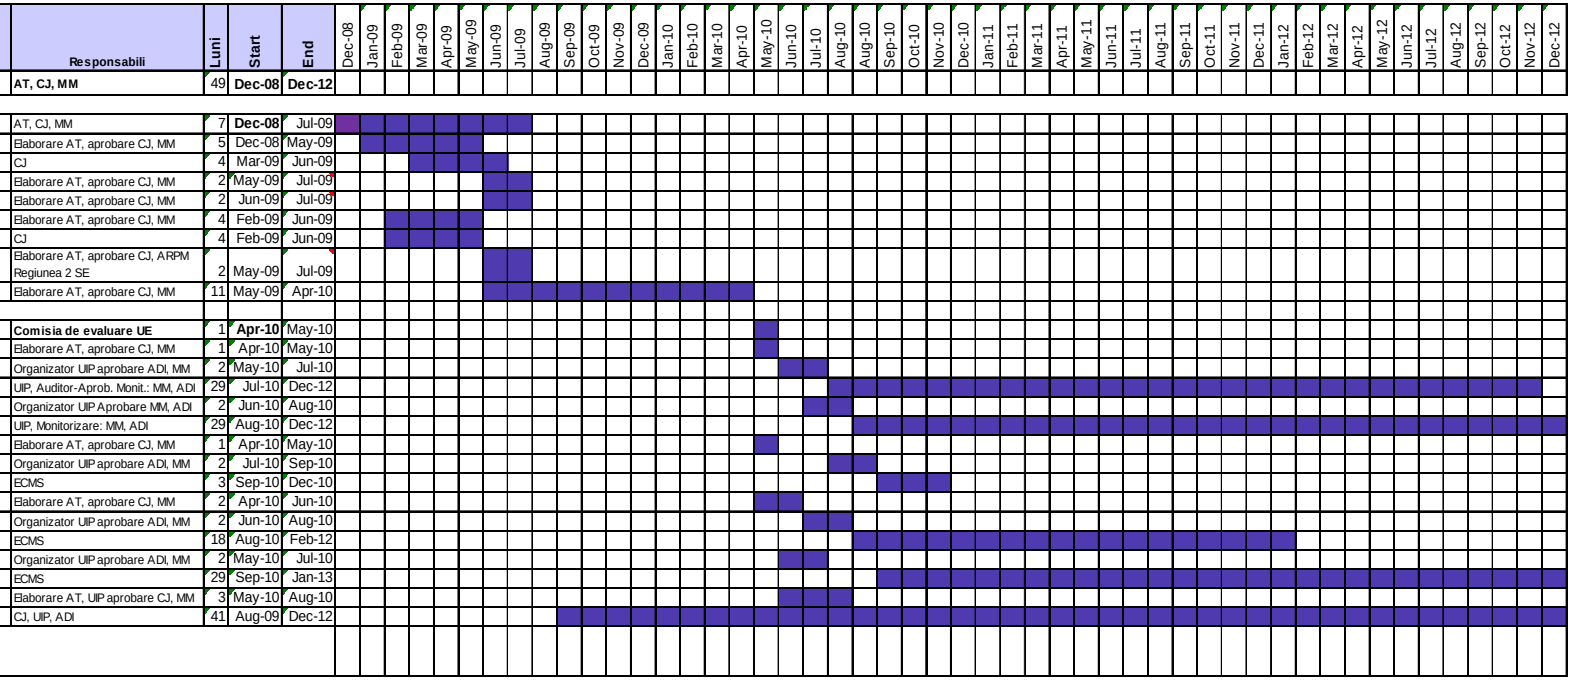

* Licitatie si contractare servicii Audit include si pregatirea documentatiei de atribuire - contracte servicii

ECMS Executie Contractant, monitorizare supervizare AT, ATM, UIP,MM

ROMAIR CONSULTING LTD.

ideas to lead the future
